



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME: 1 ER. TRIMESTRE 2021 (ENERO - MARZO)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	
CCT:	07DPB2451F	
MUNICIPIO:	LAS MARGARITAS	LOCALIDAD: PLAN DE AYALA
NÚMERO DE CONTRATO:	2021006-056	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA	
FECHA DE CONTRATO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios(planta baja Edif C)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (planta alta Edificio C)	M2	239.36
Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja Edif D)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (planta alta Edificio D)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (edificio E)	M2	192.00
Cisterna de concreto de capacidad 99m3	PZA	1.00
Construcción de Andador de concreto armado	M2	288.06
Construcción de Cancha de usos múltiples piso de concreto	M2	540.00
Construcción de Plaza Cívica de concreto	M2	96.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	12.00
Construcción de Banqueta de concreto	M2	156.70
Construcción de muro de contención de mampostería	M2	81.49
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00
Asta de Bandera de concreto de 6x3 m inc. cimentacion, firme y muro	PZA	1.00




PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	14,949,796.64	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	257,755.09	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	15,207,551.71	
MONTO CONTRATADO:	\$	14,949,796.62	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	0.02	
ANTICIPO:	\$	4,484,938.98	FECHA: 13/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,282,186.57	FECHA: 08/03/2021
EMPRESA:	PROMOTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR HUMBERTO PINTO MOLINIA		
INICIO:	02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
AVANCE FÍSICO:	22.07%		
AVANCE FINANCIERO:	36.00%		
SUPERVISOR:	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		
ZONA Y JEFE:	ARQ. FRANSICO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

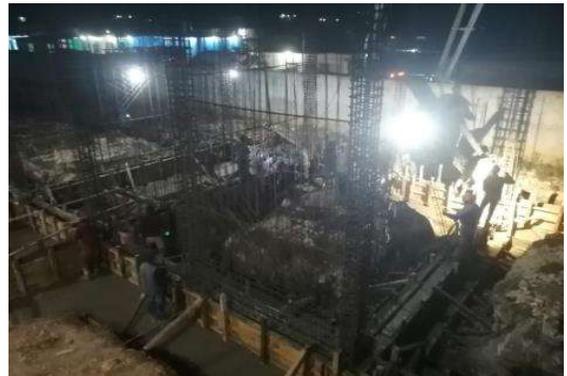



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

