



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 154		
CCT:	07DST0156C		
MUNICIPIO:	SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS	LOCALIDAD:	IWILTIC
NÚMERO DE CONTRATO:	1921001-0262		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-017-2019		
FECHA DE CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS,01 SERVICIOS SANITARIOS,01 ADMINISTRACION,01 BODEGA,01 TALLER DE COMPUTO,01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,182,748.32	
MONTO COMPROMETIDO:			
MONTO CONTRATADO:	\$	14,177,113.99	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	5,634.33	
ANTICIPO:	\$	4,253,134.20	FECHA:
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,880,656.64	FECHA: 20/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,969,948.96	FECHA: 21/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	2,023,358.86	FECHA: 20/04/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	2,618,020.61	FECHA: 09/08/2020
ESTIMACIÓN 05-F:	\$	3,729,664.92	FECHA: 08/09/2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GORES,S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ		
INICIO:	26/12/2019	TERMINO:	07/06/2020
REPROGRAMACIÓN:	DEL 22/01/2020 AL 23/09/2020		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		




PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

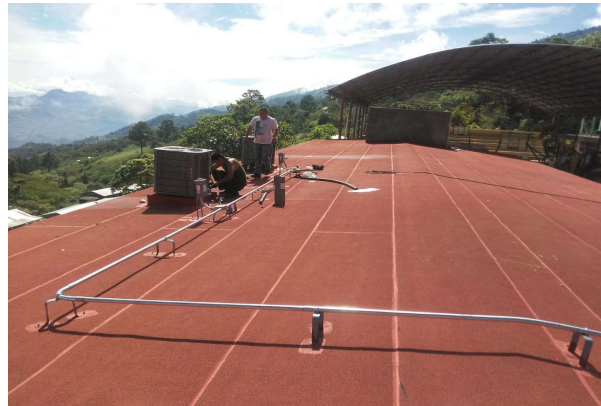



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

