



## PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS


EJERCICIO FISCAL:	2022-2023		
PERÍODO DE INFORME:	1ER. TRIMESTRE 2	023	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CCT 07DPR4118P de la	ura Educativa en la Primaria Miguel a Localidad de Absalón Castellanos
CCT: 07 <del>DP</del> R4118P			
MUNICIPIO: JIQU	IPILAS	LOCALIDAD:	ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	2215005-FS-009		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN [	DIRECTA	
FECHA DE CONTRATO:	diciembre 13, 20	22	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3273/2022		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	690,165.69	
AUTORIZADO 1 AL MILLAR:	\$	690.17	
MONTO CONTRATADO:	\$	689,475.52	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	-\$	0.00	
ANTICIPO: \$	206,842.65		
EMPRESA: ALDA DEL SUR G	RUPO CONSTRUCTOR E INN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	
INICIO: 09 DE ENERO DE 2023		TERMINO:	09 DE MARZO DE 2023
AVANCE FÍSICO: 100.00%	ó		
AVANCE FINANCIERO:	42%		
ZONA Y JEFE: ZONA 1	ING. ROEMBERG MA	CIAS TOALA	




**FOTOS** 












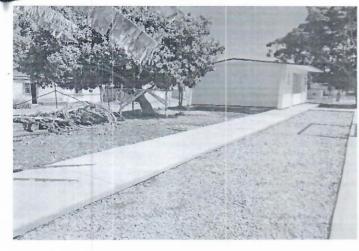

Human

indle
