



2 1 1 2 0 7 3 0

INDICE

MISIÓN Y VISIÓN.....	2
2.5 EDUCACIÓN	
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA.....	3
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.....	4
CUADRO DE INDICADORES DE RESULTADOS	
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....	13
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	14
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	



2 1 1 2 0 7 3 0

MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez, y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo

VISIÓN

Consolidarse y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	10. Programa de Infraestructura Física Educativa. 11. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

En el Segundo Trimestre de 2019, se tiene concluido: **Un** Servicio Sanitario, **Una** Rehabilitación y **Una** Obra Exterior. Con estas acciones se beneficiaron a **6** mujeres y **8** hombres, haciendo un total de **14** alumnos.

Así mismo se tienen en proceso de ejecución: **54** Aulas Didácticas, **21** Servicios Sanitarios, **Una** Cancha de Usos Múltiples, **Una** Sala de Usos Múltiples, **19** Rehabilitaciones, **Una** Plaza Cívica, **55** Obras Exteriores y **Una** Dirección. con estas acciones se beneficiarán a **3,063** mujeres y **3,172** hombres, haciendo un total de **6,235** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 7 3 0

Se tienen como acciones relevantes:

Primaria Descentralización Educativa, ubicada en la Localidad de: San Antonio Z, Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior

Secundaria Técnica No. 55, ubicada en la localidad de: Jesús María Garza, Municipio de Villaflores, Chiapas. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)

Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Ubicada en la localidad de: El Gavilán, Municipio de Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas. Atendida con la construcción de 1 aula didáctica y obra exterior.

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	10. Programa de Infraestructura Física Educativa. 11. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Objetivo del Proyecto: Como parte de Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el Instituto de la Infraestructura física educativa del estado



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 7 3 0

de chiapas tiene la encomienda de Normar y Certificar la Calidad de la Infraestructura Física en todos los niveles educativos.

Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos


Al Segundo trimestre de 2019, se elaboraron **135** cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los niveles educativos, **8** validaciones y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos y se elaboraron **12** dictámenes técnico-estructural; beneficiando a **10** mujeres y **20** hombres, haciendo un total de **30** servidores públicos.

Proyecto: Contrato de obra de infraestructura educativa

Al Segundo Trimestre de 2019, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de **94** contratos de obra pública; beneficiando a **10** mujeres y **12** hombres, haciendo un total de **22** servidores públicos.

Proyecto: Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas

Al Segundo Trimestre de 2019, se realizaron **285** supervisiones de obra en los diversos niveles educativos que comprende el informe; beneficiando a **8** mujeres y **23** hombres, haciendo un total de **31** servidores públicos.

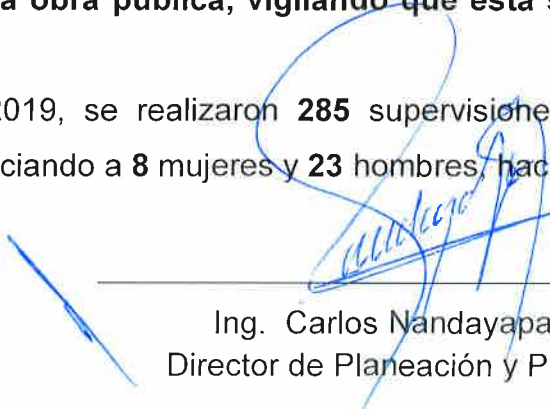

Ing. Carlos Nandayapa Ramírez
Director de Planeación y Programación

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
EDUCACIÓN																					
EDUCACIÓN BÁSICA																					
566 881 878.68											566 881 878.68										
38 004 843.23											38 004 843.23										
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA RAMO 33-1007 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	300 165 228.00	300 165 228.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2						
B002		JARDÍN DE NIÑOS HEROES Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y rehabilitación	Espacios educativo	3.00	3.00	1.20	40.00	0.00	1 729 636.41	841 840.78	Ocosingo	Nuevo Monte	25	26	51						
B003		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 1 aula cocina y sanitarios rurales	Espacios educativo	2.00	2.00	1.61	80.40	0.00	1 313 581.98	656 790.99	Ocozacoauilla de	América Libre	21	23	44						
B004		JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales	Espacios educativo	3.00	3.00	1.53	51.00	0.00	1 124 414.12	562 207.06	Paténque	Adolfo López	12	10	22						
B005		JARDÍN DE NIÑOS ANDRES SERRA ROJAS Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	1.36	45.36	0.00	1 370 629.37	685 314.68	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	46	33	79						
B006		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 1 aula cocina y sanitarios rurales	Espacios educativo	2.00	2.00	0.53	26.45	0.00	1 662 711.61	831 355.80	Teopisca	Bolén Nuevo San Gerón	34	27	61						
B007		JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	0.70	23.48	0.00	1 006 145.79	503 072.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	39	47	86						
B008		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación	Espacios educativo	4.00	4.00	1.28	32.00	0.00	1 878 955.97	917 204.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	141	144	285						
B009		JARDÍN DE NIÑOS TEPOXINA PINTADO Construcción de 5 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores)	Espacios educativo	6.00	8.00	5.69	71.15	0.00	3 513 837.59	1 756 918.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	118	118	236						
B010		JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 414 795.26	707 397.63	Ocozacoauilla de Espinosa	Ocozacoauilla de Espinosa	0	0	0						
B011		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral y rehabilitación de edificio "e" y "d")	Espacios educativo	4.00	4.00	0.80	20.00	0.00	2 002 315.30	600 694.59	Altamirano	Altamirano	13	19	32						
B012		JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda mixta)	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	725 107.66	560 291.51	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillón	11	13	24						
B013		JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL Construcción de un aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y barda perimetral mixta)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.80	40.00	0.00	1 220 785.48	366 235.64	Suchiate	Jesús	18	22	40						
B014		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 5 aulas didácticas, demolición de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de acceso principal)	Espacios educativo	7.00	7.00	5.22	74.50	0.00	2 097 427.87	629 228.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	109	110	219						
B015		JARDÍN DE NIÑOS PREESCOLAR INDIGENA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a, y c, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de enmallado perimetral y acceso principal)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.17	8.33	0.00	1 054 600.96	316 380.29	Paténque	Agua Blanca	47	87	134						
B016		JARDÍN DE NIÑOS FLORENTINA GRAJALES COUTINO Construcción de 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples, demolición edificio f, rehabilitación edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Espacios educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 538 055.92	461 416.78	Villaflores	Calzada Larja	37	32	69						
B017		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a y c, demolición de edificio b, y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de asta bandera)	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 346 158.64	703 647.59	Ocosingo	Damasco	0	0	0						
B018		JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA Construcción de 2 aulas didácticas, aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 625 686.01	487 706.04	Chiapa De Corzo	Salvador Urbina	0	0	0						
B020		JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.60	15.00	0.00	1 371 512.47	411 453.74	El Porvenir	Las Platas	8	13	21						
B021		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 1 aula didáctica, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.12	6.04	0.00	646 109.99	190 502.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	61	80	149						
B022		JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA Construcción de 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.80	40.00	0.00	855 292.45	256 587.74	Philaquin	Progreso	21	28	49						
B023		JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.01	1.00	0.00	1 382 259.17	414 677.75	Jitotul	Rubén Jaramillo	25	20	45						
B024		JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS Rehabilitación de edificio a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, plaza cívica, enmallado perimetral y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 163 459.36	349 037.81	Jitotul	Carmen Zucatal	40	42	82						
B025		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación del edificio "a", construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 618 254.21	0.00	Berriozabal	Vegetarimosa	0	0	0						
B026		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA Construcción de 1 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	923 838.91	277 151.67	Copamala	Tierra Blanca	0	0	0						
B027		JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO						0.00	1 121 709.86	0.00	Copamala	Copamala	0	0	0						

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
B028		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacios educativo	2.00	2.00	0.00	0.00											
B001		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	896 712.71	0.00	Francisco León	San Miguel la Sardina	0	0	0			
B001		JARDIN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ ZAMBRANO DE AGUILAR Rehabilitación edificios a, b, y c, obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.20	20.28	0.00	1 481 316.74	444 395.02	Frontera Comalapa	Frontera	64	98	162			
B001		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	15 876 316.65	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B002		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ISTMO-COSTA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	29 768 825.83	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B003		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN MESETA COMITECA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	31 266 406.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B004		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN NORTE) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	36 632 654.15	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B005		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSEL'TAL) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	54 716 650.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B006		PRIMARIA BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 1 aula cocina y obra exterior	Espacios educativo	2.00	2.00	0.98	48.87	0.00	1 291 254.70	1 001 369.86	Comilán de	Laguna Seca	8	13	21			
B007		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 522 356.97	761 178.48	Comilán de	San Antonio Z	6	8	14			
B008		PRIMARIA ACAMAPICHTLI Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	0.86	28.69	0.00	1 547 132.15	773 566.07	Ocozacoauilla de	Las Flores	17	25	42			
B009		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacios educativo	2.00	2.00	1.72	86.00	0.00	1 070 629.22	779 080.84	Paténque	Hermenegildo	75	61	136			
B010		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales	Espacios educativo	4.00	4.00	1.60	40.00	0.00	1 662 652.62	994 116.00	Salto de Agua	América Libre	27	27	54			
B011		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	0.97	32.36	0.00	1 607 862.81	965 638.11	Teopisca	Los Llanitos	40	34	74			
B012		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales	Espacios educativo	3.00	3.00	1.20	40.00	0.00	1 199 816.19	597 043.11	Ocosingo	Lucumija	23	27	50			
B013		PRIMARIA JACINTO CANEK Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	2.13	53.30	0.00	1 226 999.63	605 487.36	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	22	22	44			
B015		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.80	20.00	0.00	1 785 959.29	535 787.79	Las Margaritas	Francisco Villa	63	61	124			
B016		PRIMARIA ERACLIO ZEPEDA RAMOS Obra exterior (demolición y construcción de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	0.38	37.90	0.00	679 759.93	203 927.98	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	61	72	133			
B017		PRIMARIA LIC GABRIEL RAMOS MILLAN Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barda perimetral, andadores y escalones)	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 019 374.60	605 812.38	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0			
B019		PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Construcción de sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral)	Espacios educativo	7.00	7.00	0.26	3.67	0.00	815 103.66	244 531.10	Amatenango Del Valle	San Miguel El Alto	17	15	32			
B021		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, hacendal y muro de contención de mampostería)	Espacios educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1 140 807.92	342 242.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
B022		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Demolición edificio b, construcción de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior y andadores)	Espacios educativo	10.00	10.00	1.84	18.43	0.00	2 304 793.22	691 437.97	Frontera Comalapa	Sabinalito	127	130	257			
B023		PRIMARIA NICOLAS BRAVO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención de mampostería)	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 618 392.46	486 517.74	Chamula	Kololté	0	0	0			
B024		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Rehabilitación del edificio "a", construcción de sanitarios rurales, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 828 541.72	548 562.52	Emiliano Zapata	Nuevo	0	0	0			
B025		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación de edificios "a", "f" y "e", construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 451 138.46	0.00	Ocozacoauilla de	Ignacio Zaragoza	0	0	0			
B026		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Rehabilitación de edificio "a", construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rural y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza divida, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 372 946.25	0.00	Rayón	Guadalupe	0	0	0			
B027		PRIMARIA ANTONIO CASO Rehabilitación del edificio b, construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza divida, andadores)	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4 513 709.71	1 354 112.91	Chiapa De Corzo	Nueva Palestina	0	0	0			
B028		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Demolición de edificio e y g, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 151 348.20	645 404.46	Bonitozabal	Bonitozabal	0	0	0			

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META				PRESUPUESTO APROBADO (PE\$)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PE\$)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PE\$)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B029		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacios educativo	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	5 291 332,34	1 587 399,70	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B030		PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 368 767,91	0,00	Siltepec	El Madronal	0	0	0
B031		PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 809 776,24	0,00	Larráinzar	Tentic	0	0	0
B032		PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de dirección, cocina y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 578 365,78	0,00	Venusliano	Ricardo Flores	0	0	0
B033		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacios educativo	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3 236 594,75	0,00	Ocosingo	La Reforma	0	0	0
B034		PRIMARIA ILHUICAMINA Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacios educativo	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4 645 686,13	0,00	Molozintla	Molozintla de	0	0	0
B035		PRIMARIA ANGEL POLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacios educativo	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	977 165,68	0,00	Siltepec	Siltepec	0	0	0
B036		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aulas didáctica, cocina, demolición y obra exterior	Espacios educativo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2 842 383,96	0,00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
B037		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 270 553,05	0,00	Jiquipilas	Vicente Guerrero	0	0	0
B038		PRIMARIA CUAUHEMOC Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacios educativo	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	730 300,16	0,00	Jitolol	El Paraíso	0	0	0
B039		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior	Obra	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	919 763,93	0,00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
B040		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,74	0,00	Aldama	Yelón	0	0	0
B041		PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Terminación de construcción de 7 aulas en dos módulos 3 y 4, consistente en aplanados, pisos, pintura, impermeabilización, banquetas, ceja perimetral, andadores, terminación de rehabilitación de la impermeabilización y p	Obra	1,00	1,00	0,70	70,00	0,00	4 258 731,56	0,00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609
B042		PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c,d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (rosanede fisuras), cancelería, instalación eléctrica, sistema, servicios sanitarios, impermeabilización y p	Rehabilitación	1,00	1,00	0,80	80,00	0,00	2 030 000,00	0,00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616
B001	4	PRIMARIA LEYES DE REFORMA Rehabilitación	Rehabilitación	1,00	1,00	0,51	50,84	0,00	835 825,15	417 912,57	Tónala	San Francisco el Ocalal	32	28	60
B003		PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1,00	1,00	0,43	43,48	0,00	2 391 498,61	717 449,58	Zinacantan	Pasté	337	343	680
B005		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Rehabilitación edificio b y Rehabilitación de domo	Rehabilitación	2,00	2,00	0,02	1,00	0,00	526 286,75	157 886,03	Tapachula	Tapachula De Córdoba Y	173	171	344
B006		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	623 859,62	0,00	Amatenango de la Frontera	Peña Bermeja	0	0	0
B001		TELESECUNDARIA NO 1487 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral)	Espacios educativo	5,00	5,00	2,27	45,46	0,00	3 394 491,86	1 018 347,56	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	31	25	56
B002		SECUNDARIA TÉCNICA NO 55 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacios educativo	2,00	2,00	0,42	21,13	0,00	1 599 618,77	479 885,63	Villaflores	Jesús María Garza	233	230	463
B003		TELESECUNDARIA NO 1094 BENITO JUÁREZ Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c	Espacios educativo	2,00	2,00	1,40	70,00	0,00	1 753 616,03	934 140,23	Mazatlán	Santa Clara	23	23	46
B004		TELESECUNDARIA NO 301 Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso)	Espacios educativo	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1 602 887,05	480 866,12	Tonalá	La Polca	0	0	0
B005		TELESECUNDARIA NO 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores)	Espacios educativo	1,00	1,00	0,13	13,00	0,00	1 507 049,31	452 114,79	Ocozacoautla De	El Gavilán	65	64	129
B006		TELESECUNDARIA NO 1335 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, y andadores)	Espacios educativo	1,00	1,00	0,45	45,00	0,00	977 046,66	293 114,00	Molozintla	Libertad Catera	38	27	65
B007		TELESECUNDARIA NO 1058 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio e	Espacios educativo	1,00	1,00	0,25	25,00	0,00	2 981 201,93	894 360,58	Tuxtla Chico	1A. Sección De Medio Monte	41	34	75
B008		SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención)	Espacios educativo	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4 282 394,08	1 284 715,22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B009		TELESECUNDARIA NO 1426 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 134 957,15	640 487,15	Mezcalapa	Alianza	0	0	0
B010		TELESECUNDARIA NO 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didáctica, Sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria plaza cívica, muro gavión, andadores, escalones y enmallado perimetral)	Espacios educativo	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3 081 333,95	624 340,19	Mapastepec	Las Palmas	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B011		TELESECUNDARIA NO 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 753 658.28	526 097.48	Ixtapa	Carlos A. Vidal	0	0	0
B012		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26 Rehabilitación, obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 852 077.18	0.00	Jiquipilas	Tiitepec	0	0	0
B013		TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 262 556.58	0.00	Escuintla	Unión Jamaica	0	0	0
B014		TELESECUNDARIA NO 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 037 452.61	0.00	Chamula	Yaichilom	0	0	0
B015		TELESECUNDARIA 1264 AMADO NERVO Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 711 177.98	0.00	Jitotul	Matasano	0	0	0
B001		TELESECUNDARIA NO 270 BATALLA DE PUEBLA Rehabilitación edificio c,d y e obra exterior (sustitución de barda)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.60	60.00	0.00	2 102 296.79	1 125 166.42	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	92	112	204
B002		TELESECUNDARIA 425 ESCUADRÓN 201 Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 417 829.34	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	103	105	208

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
EDUCACIÓN																				
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR											47 864 284.32	47 864 284.32	0.00							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
B001		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008. Constituye una previsión	Previsión					25 990 946.32	5 937 274.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
B002		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008. Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 873 338.00	21 873 338.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
B003		COBACH NO. 61 CHANAL. Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores).	Espacios educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 928 464.31	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0					
B004		EMSAD NO. 94 POJCOL CHIQUINIVAL. Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior).	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 937 365.10	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0					
B005		EMSAD NO. 211 CHULUM JUAREZ. Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores).	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 000 461.03	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0					
B006		EMSAD NO. 202 LAGUNA DEL COFRE. Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores).	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 235 375.60	0.00	Molecrisio de	Laguna del Cofre	0	0	0					
B007		COBACH NO. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE. Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores).	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 103 448.39	0.00	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	0	0	0					
B008		COBACH NO. 47 PUEBLO NUEVO. 02 Aulas Didácticas Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andado es Y Muro De Contención De Mampostería).	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 709 043.54	0.00	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	0	0	0					
B009		CECYT HUIXTAN 01 laboratorio de alimentos y obra exterior	Espacios educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 385 383.40	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0					
B010		CECYT BOCHIL Construcción de 01 Aula Didáctica, servicios Sanitarios y Obra Exterior.	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 219 334.11	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0					
B011		CECYT RICARDO FLORES MAGON Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior.	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 534 798.09	0.00	Venustiano	Ricardo Flores	0	0	0					

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
EDUCACIÓN																				
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							37 334 089.83	41 982 470.44	14 056 223.47											
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	94.00	31.33	4 239 239.54	4 238 741.44	1 584 962.13	Cobertura estatal	Cobertura estatal	10	12	22					
A001		LEVANTAMIENTO DE CEDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	135.00	30.61	5 557 514.65	5 557 016.55	2 071 962.10	Cobertura estatal	Cobertura estatal	10	20	30					
A001		SUPERVISION DE OBRA PUBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS OBRAS AUTORIZADAS	Supervisión	3 242.00	3 242.00	285.00	8.79	5 231 271.55	5 230 773.45	1 956 628.59	Cobertura estatal	Cobertura estatal	8	23	31					
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.50	50.00	2 677 118.05	2 676 619.95	997 232.50	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	8	11					
A001	4	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES. Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1 500.00	1 500.00	94.00	6.27	3 457 881.62	3 457 881.62	1 297 535.07	Cobertura estatal	Cobertura estatal	6	11	17					
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	2.00	50.00	13 606 639.01	18 256 008.22	5 185 099.82	Cobertura estatal	Cobertura estatal	11	17	28					
A001		IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMATICA Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE. Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	800.00	800.00	321.00	40.13	1 101 747.66	1 101 249.56	416 356.87	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2	3	5					
A001		REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA. Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	380.00	50.33	1 462 677.75	1 462 179.65	546 446.39	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2	5	7					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
38 004 843.23	9	Industria, innovación e infraestructura	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	<p>Al Segundo Trimestre, se tiene concluido: Un Servicio Sanitario, Una Rehabilitación y Una Obra Exterior. Con estas acciones se beneficiaron a 6 mujeres y 8 hombres, haciendo un total de 14 alumnos.</p> <p>Así mismo se tienen en proceso de ejecución: 54 Aulas Didácticas, 21 Servicios Sanitarios, Una Cancha de Usos Múltiples, Una Sala de Usos Múltiples, 19 Rehabilitaciones, Una Plaza Cívica, 55 Obras Exteriores y Una Dirección. con estas acciones se beneficiaran a 3,063 mujeres y 3,172 hombres, haciendo un total de 6,235 alumnos.</p> <p>Se tiene como acciones relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primaria Descentralización Educativa, ubicada en la Localidad de: San Antonio Z, Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior - Secundaria Técnica No. 55, ubicada en la localidad de: Jesús María Garza, Municipio de Villaflores, Chiapas. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores) - Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Ubicada en la localidad de: El Gavilán, Municipio de Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas. Atendida con la construcción de 01 aula didáctica y obra exterior.

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
745.7	750.4	4.6	0.62

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	0.0	0.0	0.0	Al reporte del trimestre no se cuentan con ampliaciones al presupuesto.
Ampliaciones:				
Reducciones:	333.6	137.0	- 196.6	Por las reducciones del FAM para el Fideicomiso y de proyectos Institucionales
Adecuaciones Internas:	412.2	613.4	201.2	Las adecuaciones se presentan por al autorización de otras partidas presupuestarias a proyectos Institucionales
TOTAL	745.8	750.4	4.6	
