INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

EJERCICIO FISCAL:	2022-2023		
PERÍODO DE INFORME:	**3ER.** TRIMESTRE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Fray Victor Maria Flores Fernandez, con clave CCT: 07DPR1104S en la localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Yajalón, Chiapas.		
CCT:	07DPR1104S		
MUNICIPIO:	YAJALÓN	**LOCALIDAD:**	LÁZARO CÁRDENAS
NÚMERO DE CONTRATO:	2215001-FS-014		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. DIC-FIES-009-2022		
FECHA DE CONTRATO:			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3273/2022		
AUTORIZADO DE OBRA:	$ 2,294,914.18		
AUTORIZADO 1 AL MILLAR:	$ 2,294.91		
MONTO CONTRATADO:	$ 2,285,936.34		
ECONOMÍA REINTEGRADA:	$ 6,682.93		
ANTICIPO:	$ 685,780.90		
EMPRESA:	CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA S.A. DE C.V.		
INICIO CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	**TERMINO CONTRATO:**	13 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIO DIFERIMIENTO:	09 DE FEBRERO DE 2023	**TERMINO DIFERIMIENTO:**	24 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE FEBRERO DE 2023	**TERMINO REAL:**	23 DE JUNIO DE 2023
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
ZONA Y JEFE:	ZONA 3	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO	

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

FOTOS

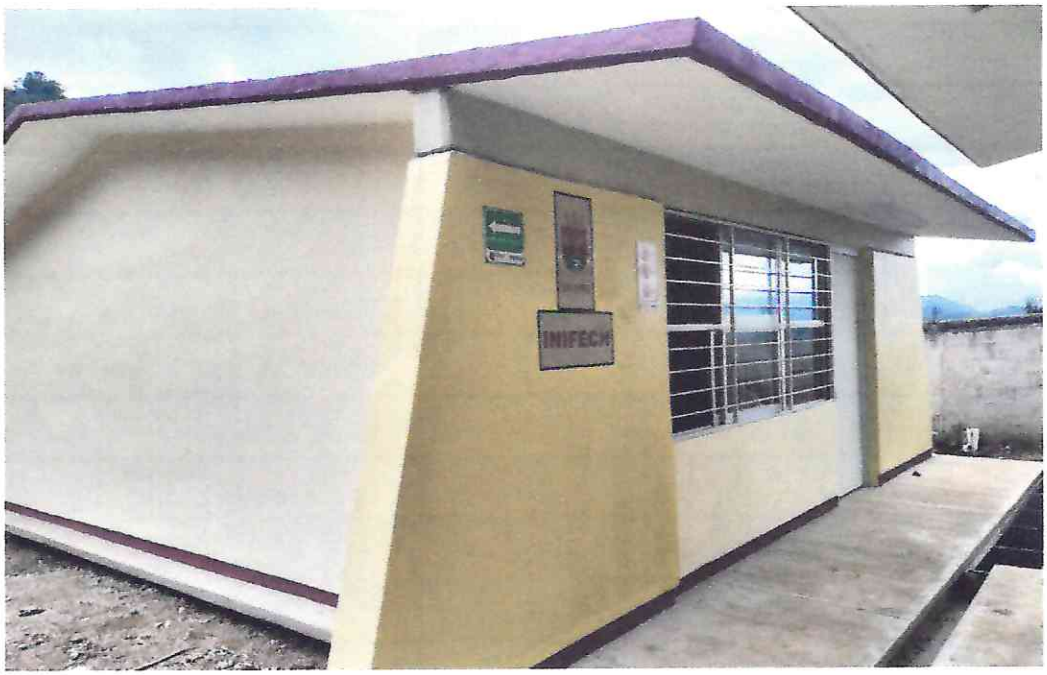

CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA

CONSTRUCCION DE 01 SERVICIO SANITARIO

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

FOTOS

MOBILIARIO Y EQUIPO

REHABILITACION DE EDIFICIOS

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

FOTOS

REHABILITACION DE EDIFICIO

OBRA EXTERIOR
